

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출 석면의 종류	분석 계수 시야 수
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.95	08월05일	10:00 ~ 14:03	0.002	-	100
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.95	08월05일	10:03 ~ 14:06	0.002	-	100
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.91	08월05일	10:06 ~ 14:09	0.002	-	100
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.96	08월05일	10:09 ~ 14:12	0.002	-	100

(신내공기질공정시험기준 ES 02303.1)

문서일자 : 2025. 08. 05

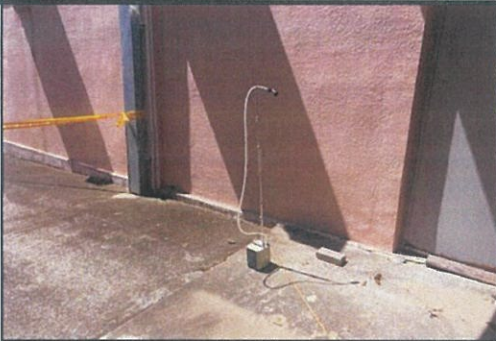
No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	강천중학교	부지경계선(동)	HV01	9.95	243	2417.85	9	100	0.002	노출기준 미만
2	강천중학교	부지경계선(서)	HV02	9.95	243	2417.85	10	100	0.002	노출기준 미만
3	강천중학교	부지경계선(남)	HV03	9.91	243	2408.13	12	100	0.002	노출기준 미만
4	강천중학교	부지경계선(북)	HV04	9.96	243	2420.28	11	100	0.002	노출기준 미만
				- 이하여백 -						
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 시료는 별도의 통보가 없는 한 30일 이내에 폐기처분됩니다.



별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)	 측정 시작 시간: 10시 00분	 측정 종료 시간: 14시 03분	-
부지경계선 (서)	 측정 시작 시간: 10시 03분	 측정 종료 시간: 14시 06분	-
부지경계선 (남)	 측정 시작 시간: 10시 06분	 측정 종료 시간: 14시 09분	-
부지경계선 (북)	 측정 시작 시간: 10시 09분	 측정 종료 시간: 14시 12분	-

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 04 : 측정지점

* 석면함유 총 면적 : 1,555.20 m²

* 특이사항 : 공사 (석면해체작업) 개시 전 측정
