

별지 1. [별지 제19호 서식] 관련

- 측정결과

* 석면노출기준 : 0.01 개/cc 이하

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출 석면의 종류	분석 계수 시야 수
HV01	부지경계선(동)	KMS-5100/1	9.94	08월08일	10:50 ~ 14:53	0.002	-	100
HV02	부지경계선(서)	KMS-5100/1	9.95	08월08일	10:52 ~ 14:55	0.002	-	100
HV03	부지경계선(남)	KMS-5100/1	9.90	08월08일	10:54 ~ 14:57	0.002	-	100
HV04	부지경계선(북)	KMS-5100/1	9.94	08월08일	10:56 ~ 14:59	0.002	-	100
HV05	위생설비지점	KMS-5100/1	9.92	08월08일	11:05 ~ 11:48	0.003	-	300
HV06	폐기물반출구	KMS-5100/1	9.93	08월08일	13:00 ~ 13:43	0.005	-	300
HV07	음압기배출구	KMS-5100/1	9.92	08월08일	11:52 ~ 12:35	0.003	-	300
HV08	음압기배출구	SARA-5100/1	9.91	08월08일	11:55 ~ 12:38	0.004	-	300
HV09	음압기배출구	SARA-5100/1	9.98	08월08일	11:58 ~ 12:41	0.004	-	300
HV10	음압기배출구	KMS-5100/1	9.97	08월08일	13:46 ~ 14:29	0.004	-	300
HV11	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.93	08월08일	15:01 ~ 15:44	0.003	-	300
HV12	폐기물보관지점	KMS-5100/1	9.96	08월08일	15:02 ~ 15:45	0.003	-	300

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1)

■ 접수일자 : 2025. 08. 08

■ 분석일자 : 2025. 08. 09

■ Analyst : 신 승 연

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	감천중학교	부지경계선(동)	HV01	9.94	243	2415.42	12	100	0.002	노출기준 미만
2	감천중학교	부지경계선(서)	HV02	9.95	243	2417.85	12	100	0.002	노출기준 미만
3	감천중학교	부지경계선(남)	HV03	9.90	243	2405.70	10	100	0.002	노출기준 미만
4	감천중학교	부지경계선(북)	HV04	9.94	243	2415.42	11	100	0.002	노출기준 미만
5	감천중학교	위생설비지점	HV05	9.92	43	426.56	9	300	0.003	노출기준 미만
6	감천중학교	폐기물반출구	HV06	9.93	43	426.99	13	300	0.005	노출기준 미만
7	감천중학교	음압기배출구	HV07	9.92	43	426.56	8	300	0.003	노출기준 미만
8	감천중학교	음압기배출구	HV08	9.91	43	426.13	10	300	0.004	노출기준 미만
9	감천중학교	음압기배출구	HV09	9.98	43	429.14	11	300	0.004	노출기준 미만
10	감천중학교	음압기배출구	HV10	9.97	43	428.71	11	300	0.004	노출기준 미만
11	감천중학교	폐기물보관지점	HV11	9.93	44	436.92	9	300	0.003	노출기준 미만
12	감천중학교	폐기물보관지점	HV12	9.96	44	438.24	8	300	0.003	노출기준 미만
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

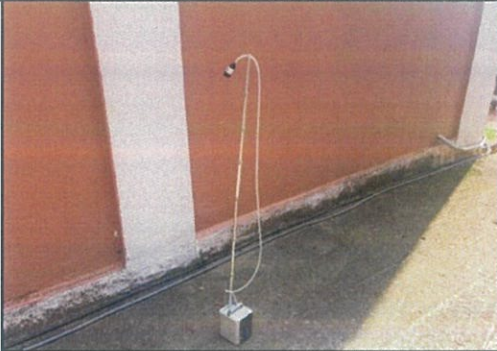
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 제발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



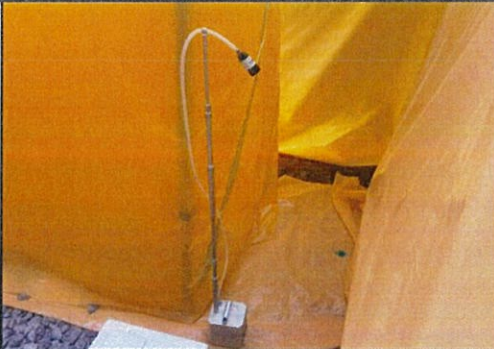
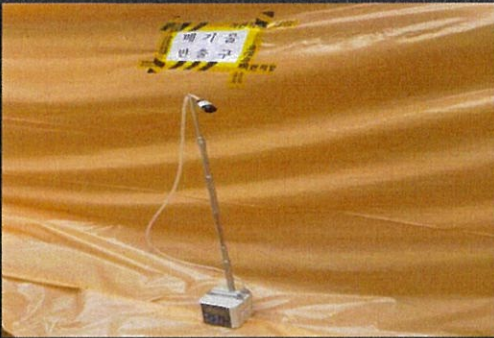
별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 10시 50분	측정 종료 시간: 14시 53분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 10시 52분	측정 종료 시간: 14시 55분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 10시 54분	측정 종료 시간: 14시 57분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 10시 56분	측정 종료 시간: 14시 59분	

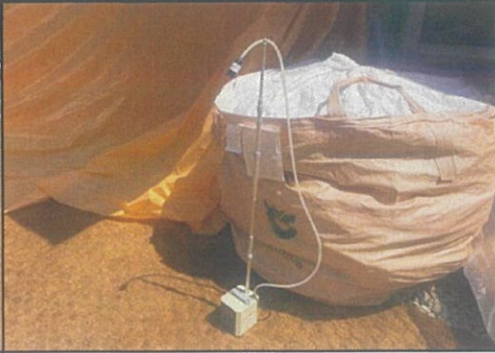
별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 지점			-
	측정 시작 시간: 11시 05분	측정 종료 시간: 11시 48분	
폐기물 반출구			-
	측정 시작 시간: 13시 00분	측정 종료 시간: 13시 43분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 11시 52분	측정 종료 시간: 12시 35분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 11시 55분	측정 종료 시간: 12시 38분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 11시 58분	측정 종료 시간: 12시 41분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 13시 46분	측정 종료 시간: 14시 29분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 15시 01분	측정 종료 시간: 15시 44분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 15시 02분	측정 종료 시간: 15시 45분	

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 12 : 측정지점

* 석면함유 총 면적 : 1,555.20 m²

* 특이사항 : -
